

**INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA,  
PLAN OCHRONY ZIELENI  
DLA PROJEKTU  
ROZBUDOWY UL. JURASZÓW W POZNANIU**

Opracowanie: Oaza Zieleni Joanna Mrowińska,  
ul. Jarowa 24, 61-602 Poznań

**STYCZEŃ, 2022 r.**

## **I – CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Przedmiot opracowania
2. Metodyka inwentaryzacji
  - 2.1. Podstawa prawna
  - 2.2. Sposób pomiarów
3. Inwentaryzacja dendrologiczna
  - 3.1. Charakterystyka nasadzeń
  - 3.2. Tabela inwentaryzacyjna – tabela nr 1
4. Plan ochrony zieleni

## **II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

Rys nr 1 – inwentaryzacja dendrologiczna, plan ochrony zieleni

## **1. Przedmiot opracowania**

Projekt obejmuje wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz planu ochrony zieleni w ramach opracowania projektu rozbudowy ul. Juraszów w Poznaniu.

## **2. Metodyka inwentaryzacji**

### **2.1. Podstawa prawna**

**Inwentaryzację dendrologiczną oraz kwalifikację drzew wymagających uzyskania decyzji na wycinkę wykonano zgodnie z:**

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880);
- Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017, poz.1074).

### **2.2. Sposób pomiarów**

Inwentaryzację wykonano w listopadzie 2021 roku. Pomiarów obwodów pni drzew dokonano na wysokości 130 cm oraz 5 cm dla kwalifikacji drzew do wycinki. Przy krzewach mierzono powierzchnię skupiny.

Inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów istniejących przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na rysunku w skali 1:500. Do usunięcia przeznaczono drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną infrastrukturą drogową.

## **3. Inwentaryzacja dendrologiczna**

### **3.1. Charakterystyka nasadzeń**


Wzdłuż projektowanej drogi i chodnika rosną drzewa różnych gatunków z przewagą klonu pospolitego, klonu jawora oraz robinii białej. Drzewa znajdują się w różnym wieku oraz stanie zdrowotnym. Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną infrastrukturą drogową oraz drzewa w złym stanie zdrowotnym.

### **3.2. Tabela inwentaryzacyjna – tabela nr 1**


## 4. Plan ochrony zieleni

### 4.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robót drogowych

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terenów zieleni;
- zabezpieczeniu pni na czas prowadzenia robót drogowych podlegają wszystkie drzewa w formie piennej w obrębie inwestycji;
- tereny zieleni wzdłuż grup drzew (zakres wskazany na planie sytuacyjnym) należy wygrodzić od prowadzonych robót drogowych na cały czas ich trwania ogrodzeniem budowlanym metalowym tymczasowym o wysokości 2 m mocowanym na stopach PCV albo betonowych. Ogrodzenie należy skutecznie przymocować do gruntu, tak aby nie było przestawiane w czasie prowadzenia robót.
- pnie drzew należy zabezpieczyć poprzez założenie na całej długości pnia juty/włókniny, opasek z miękkiego tworzywa/gumy wokół pnia (min. 3 szt./pień drzewa), a następnie wykonanie deskowania, deski należy mocować przy pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza się stosowania gwoździ wbijanych w pień drzewa;
- deskowanie musi zabezpieczać pnie do wys. 2-2,5 m, nie może sięgać wyżej niż pierwsze konary, aby uniknąć ich uszkodzenia;
- dolna część deski opiera się na podłożu, w przypadku nadbiegów korzeniowych deski należy obsypać ziemią.

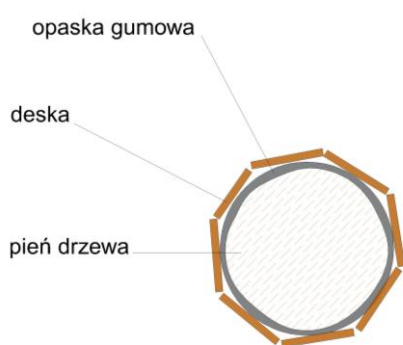

rys. 1 i 2 – schemat zabezpieczenia pni drzew

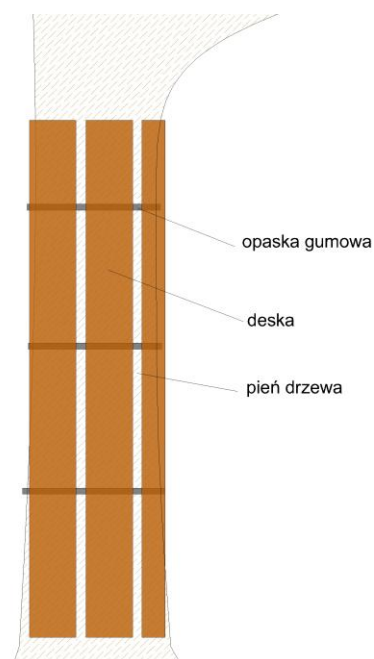

#### 4.2. Uwagi dotyczące realizacji robót drogowych

- na cały czas trwania robót drogowych konieczne jest zatrudnienie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni;
- prowadzenie robót drogowych w odległości 3 m od nasady pni drzew ręcznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni;
- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostałe drobne korzenie można przycinać jedynie ostrymi narzędziami;
- w przypadku prowadzenia wykopów w czasie mrozów odkryte korzenie należy okryć np. matami słomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczyć do niezbędnego minimum;
- w przypadku prowadzenia wykopów w czasie upałów odkryte korzenie należy okryć, a drzewa podlewać;
- nie dopuszcza się składowania jakichkolwiek materiałów budowlanych, narzędzi, sprzętu budowlanego, ziemi (w tym ziemi z wykopów), piasku, zaprawy cementowej w pobliżu drzew i ich systemów korzeniowych – minimalny zasięg wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;
- nie dopuszcza się jeżdżenia ciężkim sprzętem budowlanym w terenach zieleni, co prowadzi do zagęszczania gruntu wokół drzew.

opracowanie

mgr inż. Joanna Mrowińska

  
**OAZA ZIELENI**  
**JOANNA MROWIŃSKA**  
ul. Jarowa 24, 61-602 Poznań  
NIP 5621637475, REGON 365819734  
tel. 608786552, [www.oazazieleni.pl](http://www.oazazieleni.pl)
